



23 de febrero del 2026



PROPUESTA DE NEGOCIO

Proyecto BIBLIOTECA

Índice.

Carta de Agradecimiento.....	2
Planteamiento del Problema.....	3
Solución Propuesta y Beneficios.....	4
Especificaciones Técnicas.....	8
Metodología de Desarrollo.....	10
Equipo de Desarrollo.....	11
Plan de Proyecto.....	13
Estructura de Precios y Pagos.....	14
Experiencia y Diferenciadores.....	16
Términos y Condiciones.....	17
Firmas de Conformidad.....	19

San Pedro Garza García, Nuevo León, México
a 23 de febrero del 2026

CARTA DE AGRADECIMIENTO.

A quién corresponda,
Universidad Ducky

Aprovechamos la ocasión para saludarle y agradecer anticipadamente la oportunidad que se nos brinda de presentar nuestra propuesta de colaboración con nuestros servicios para apoyarles en el proyecto “Biblioteca” de su organización.

Nuestro equipo está comprometido a poner en práctica su experiencia técnica y de gestión de proyectos, siguiendo metodologías que garantizaran entregables en tiempo, forma y con la flexibilidad necesaria para adaptarnos a sus necesidades.

Estamos conscientes de la relevancia y responsabilidad que implica el desarrollo de este proyecto para la organización, por eso es que aseguramos la capacidad de coordinación por ambas partes que concluya en un exitoso resultado, cumpliendo con los altos estándares de calidad que caracterizan a su empresa. Es por eso que confiamos en que, trabajando en conjunto, podremos ofrecer soluciones innovadoras y funcionales que satisfagan las expectativas establecidas.

Les reiteramos nuestro agradecimiento por la confianza depositada en nosotros y por permitirnos participar en esta etapa tan importante para la Universidad Ducky. Estamos entusiasmados de iniciar esta colaboración y de aportar valor a través de nuestro trabajo. Nuestro principal objetivo es satisfacer sus necesidades y expectativas.

Nuevamente, agradecemos su consideración.

Atentamente,



Estefania Nájera de la Rosa
Scrum Master

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La biblioteca de la Universidad Ducky es uno de los servicios más importantes de la institución, la cuál no cuenta con la infraestructura tecnológica adecuada y esto limita el proceso de su transformación digital.

Esto abre paso a barreras entre el servicio bibliotecario y los beneficiarios de esta prestación, no solo en la interacción servicio-cliente, sino también en la mejora de la universidad, impidiendo la certificación bajo las normas internacionales de calidad ISO 90001 2015 bajo el umbral digital.

Es importante también mencionar que debido a esta incorporación de herramientas tecnológicas, se presentan los siguientes conflictos:

- Inconsistencias entre el catálogo.
- Disponibilidad de libros.
- Desactualización de los datos.
- Préstamos y devoluciones.
- Realización de inventarios.

El trabajar en cada uno de estos puntos de forma manual, exigiría de mucho tiempo y dedicación de varias personas, por lo que se busca la implementación de la tecnología para la automatización y mejora de cada uno de estos procesos.

Una vez detallando estos puntos y la certificación ISO 90001 2015 respectiva, es que la solución por parte del equipo, tiene como propósito el mejorar tanto la experiencia del usuario como la experiencia del bibliotecario, buscando generar un componente efectivo y eficiente para ambas partes con el objetivo de impulsar a la Universidad Ducky a soluciones tecnológicas y aumentar la competitividad con sus adversarios.

La motivación detrás del proyecto es ofrecer una solución que no solo optimice la gestión y la experiencia del sistema bibliotecario, sino que también mejore exponencialmente la calidad del servicio, reduzca riesgos (como los mencionados en los puntos anteriores) y fortalezca la relación con los usuarios, así como potencializar el renombre de la universidad.

SOLUCIÓN PROPUESTA Y BENEFICIOS.

La solución consiste en desarrollar un sistema web para la gestión de la Biblioteca de la Universidad Ducky, que permitirá automatizar los procesos que actualmente se realizan de forma manual y mejorar la calidad del servicio.

Este sistema estará diseñado como una plataforma digital centralizada, accesible en línea y con distintos niveles de acceso de acuerdo con el tipo de usuario, tales como administrador, bibliotecario, docentes y alumnos. Su implementación permitirá llevar un control más preciso y en tiempo real de la información de la biblioteca, lo cual garantizará la disponibilidad, integridad y actualización de los datos.

Esta solución contempla los siguientes módulos funcionales, los cuales permitirán:


- Registrar, actualizar y administrar el catálogo de libros.
- Consultar la disponibilidad de los ejemplares en tiempo real.
- Gestionar los préstamos, devoluciones y renovaciones.
- Validar automáticamente si un usuario está autorizado para realizar un préstamo.
- Generar reportes de alumnos con adeudos en periodos de evaluación.
- Controlar libros dañados, perdidos u obsoletos.
- Apoyar los procesos de inventario mediante herramientas digitales.
- Administrar los roles y permisos de los usuarios del sistema.

BENEFICIOS.

La implementación de esta solución traerá los siguientes beneficios:

- Automatización de los procesos bibliotecarios.
- Reducción de tiempos en préstamos y devoluciones.
- Reducción de errores humanos.
- Consulta de disponibilidad de libros en tiempo real.
- Control y actualización automática del catálogo.
- Mejor organización y control del inventario.
- Generación de reportes de adeudos de usuarios.
- Validación rápida de usuarios autorizados para préstamo.
- Reducción de la carga administrativa del personal.
- Mejora la experiencia de alumnos y docentes.
- Acceso centralizado y seguro a la información.
- Apoyo al proceso de transformación digital de la universidad.
- Cumplimiento de estándares de calidad (ISO 9001:2015).

El proyecto se realizará mediante el siguiente flujo de etapas de trabajo:

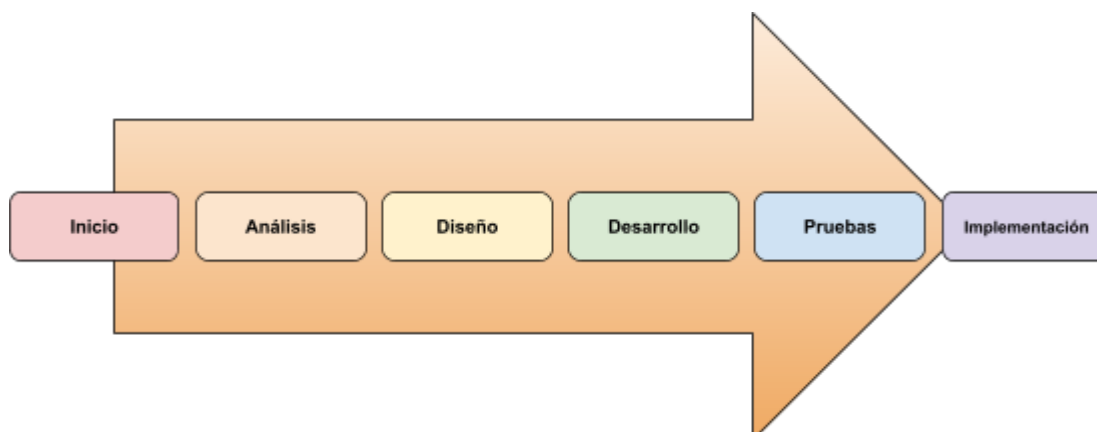

INICIO.

Etapa en la cual se aprueba la Propuesta de Negocio y se comienza a desarrollar el Plan de Trabajo.

ANÁLISIS.

En esta etapa se analizarán detalladamente los requerimientos funcionales de la aplicación de software.

DISEÑO.

Se traducen los requerimientos funcionales a especificaciones tecnológicas.

DESARROLLO.

Se construyen las especificaciones tecnológicas, en base con todos los componentes del software, como los requerimientos funcionales y técnicos.

PRUEBAS.

Se asegura que el software cumpla con los aspectos funcionales y resultados esperados mediante pruebas.

IMPLEMENTACIÓN.

Se instala la aplicación de software en la biblioteca de la Universidad de Ducky y se realiza una capacitación correspondiente a los usuarios.

Esta plataforma logrará optimizar la labor que se realiza por el bibliotecario, de igual manera resultando en un servicio más eficiente para la interacción con alumnos y docentes, el cual asegura la actualización de información en tiempo real.

Sprint.	Función.	Requerimientos.		Plataforma.		Usuarios.				
		Funcionales.	No Funcionales.	App.	Web.	Admin.	Bibliotecario.	Profesor.	Alumno.	Colaborador.
0	Gestión de usuarios.	RF01: Creación y definición de perfiles de usuario	RNF1: Autenticación de usuarios con contraseña. RNF2: Restauración de contraseña. RNF3: Tiempo de respuesta no mayor a 3 segundos. RNF4: Interfaz multiplataforma, accesible y amigable para discapacidad visual. RNF5: Navegación eficiente, bastando con solo 3 clics como máximo para procesar.	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A
1	Gestión de libros.	RF02: Solicitud de compra de libros. RF03: Generación de ficha bibliográfica. RF04: Listado de libros por diversos filtros.		N/A	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A
	Buscar libros.	RF05: Consulta de existencia y ubicación de libros en biblioteca por diversos filtros. RF06: Validación de disponibilidad de libro.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Prestar libros.	RF07: Validación de condición del solicitante sin multas o más de 2 libros en préstamo. RF08: Inhabilitación de préstamos a solicitantes mientras que no cumplan con reglas bibliotecarias. RF09: Validación de condición de libro. RF10: Registro de préstamo. RF11: Creación de recibo de préstamo. RF12: Renovación de préstamo. RF13: Gestión de lista de espera.	RNF6: Implementación de apoyo virtual por Chatbot.	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A
	Devolver libros.	RF14: Registro de devolución del libro. RF15: Generación de multas por entrega extemporánea, daño, pérdida de libro. RF: Creación de		N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A

		lista de alumnos deudores y de multas.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sprint 0: Gestión de usuarios. Primeramente se definen los roles de usuarios que ingresarán al sistema. En este caso, se definen los permisos y restricciones de los usuarios habituales de la biblioteca: administrador, bibliotecarios, colaboradores, alumnos y profesores.

Sprint 1: Gestión y búsqueda de libros. En este sprint se trabaja la funcionalidad de registro con ficha bibliográfica y visualización de libros en el sistema.

Sprint 2: Gestión de préstamo de libros. Al tener libros disponibles en el sistema, se puede trabajar con la funcionalidad de gestión de préstamos y devoluciones involucrando a usuarios como los alumnos y profesores quienes deben cumplir con reglas capturadas en el sistema sobre su condición de adeudos, multas y préstamos actuales.

Este sistema logrará:

- Registrar, actualizar y administrar el catálogo de libros.
- Consultar la disponibilidad de los libros.
- Gestionar préstamos y devoluciones.
- Controlar renovaciones de los libros.
- Validar si un alumno está autorizado para realizar un préstamo.
- Gestionar libros perdidos, dañados, u obsoletos.
- Generar listas de alumnos con adeudos para periodos de examen.
- Apoyar la realización de inventarios.

Implementando estas funcionalidades resultará en la reducción de las inconveniencias que solían presentar entre el catálogo y la existencia física de los libros dentro de la biblioteca, lo cual reducirá el tiempo de atención a los usuarios y se obtendrá un mejor control sobre la información.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Para poder implementar el producto tecnológico, la misma necesita de ciertos requerimientos para su construcción, más adelante se presentan las herramientas necesarias para la construcción del componente por sus respectivos alcances.

El patrón de arquitectura de software para conectar todos los componentes a desarrollar será el MVC (Modelo-Vista-Controlador).

DESARROLLO.

Todo el proyecto se estará escribiendo en la IDE de **Visual Studio Code**, perteneciente de Microsoft; debido a que el mismo editor soporta diversos lenguajes de programación y características particulares.

GESTIÓN.

El control de versiones se gestionará con **Git**, a la par de implementar **ambientes QA** para garantizar la entrega a lo largo de cada Sprint para reducir los errores en la producción del sistema.

INFRAESTRUCTURA.

La infraestructura del proyecto estará desplegada en la nube para la accesibilidad, flexibilidad y escalabilidad del sistema.

BASE DE DATOS.

Para la creación del componente que almacenará, distribuirá y recopilará constantemente aquellos datos nuevos, se bosquejará su modelo mediante el uso de un diagrama UML, siendo este el **Diagrama Entidad-Relación**, con el propósito de representar la arquitectura del sistema, elementos e interacción entre ellos. Esto para el eventual desarrollo de dicho diagrama mediante el lenguaje de **PostgreSQL** que pertenece al ecosistema de SQL (Structured Query Language) para la gestión de la base de datos, promoviendo la persistencia y consistencia de la información.

SEGURIDAD.

Para proteger la información de la base de datos, es que se implementarán mecanismos de **cifrado de datos en reposo** (AES-256) y **cifrado en tránsito** (HTTPS/TLS 1.2 o superior) para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos en el sistema, esto con el objetivo de cumplir las siguientes normativas:

- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
- Delitos cibernéticos (Código Penal Federal).
- Requisitos de conservación para la firma electrónica (NOM-151-SCFI-2026).

Y los siguientes estándares:

- ISO/IEC 27001.
- ISO 27002.

DESARROLLO BACKEND.

Para el desarrollo Backend del sitio web de la biblioteca, se empleará el lenguaje de programación **Python** debido a su simplicidad y frameworks compatibles como Flask y Django, al igual que el entorno de ejecución de Node.js perteneciente a JavaScript para potencializar el ecosistema y solicitudes de la biblioteca.

DESARROLLO FRONTEND.

Para realizar el bosquejo del aspecto visual del sitio web, se usará el prototipado de interfaces (UI/UX) de **Figma**, para la eventual implementación de **HTML**, **CSS**, **Javascript** y la biblioteca de **React** perteneciente a JavaScript, siendo todos estos implementados en conjunto para la construcción de una interfaz atractiva e intuitiva.

La combinación de todas estas herramientas va a permitir desarrollar un sitio web complejo, rápido y modular.

SISTEMA OPERATIVO.

Para la implementación del sistema, se empleará un SO basado en **Linux** debido a su estabilidad, seguridad y compatibilidad con los entornos de desarrollo web y servidores como Apache, sin dejar de lado el enfoque para la integración con las tecnologías mencionadas en puntos anteriores.

DESARROLLO MÓVIL.

Además, el entorno móvil será desarrollado nativamente para **Android** (Kotlin) e **iOS** (Swift), con los cuáles se emplearán **servicios REST** para permitir su comunicación con los servidores.


EXTRA.

Si por parte del cliente surgen nuevas necesidades o cambios en la estructura técnica, se recibe la documentación y el equipo la evaluará para su aprobación antes de la implementación.

METODOLOGÍA DE DESARROLLO.

Debido a lo que se solicita desarrollar, la metodología principal que se implementará para este proyecto es **SCRUM**. El tamaño del equipo de desarrollo y del proyecto es ideal para la implementación de esta metodología. De esa manera, será posible realizar el software de manera adecuada y eficiente, obteniendo los requerimientos deseados mediante Sprints para el software de la Biblioteca.

De manera complementaria, se implementará la metodología de **Software Seguro**, la cual logrará proteger la información que se encuentra en la base de datos. Esa base de datos obtiene información confidencial de la Biblioteca, igual de sus alumnos y maestros, al implementar esta metodología asegurará que se cumpla las normas y estándares requeridos para la protección adecuada.



EQUIPO DE DESARROLLO.

El proyecto se llevará a cabo por el equipo definido que trabajará bajo las metodologías establecidas anteriormente, donde cada integrante tiene un rol con sus respectivas responsabilidades para contribuir al desarrollo iterativo y cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Rol.	Integrante(s).	Responsabilidad.
Cliente.	Universidad Ducky	Definir las necesidades a abarcar con el desarrollo del sistema. Validar los requerimientos y entregas por Sprint.
Product Owner.	Dr. Felipe de Jesús Rodríguez García	Enlace entre el cliente y el equipo. Priorizar funcionalidades. Actualizar el Backlog. Comunicar cambios y asegurar objetivos con el cliente.
SCRUM Master.	Estefania Nájera de la Rosa	Facilitar y supervisar la aplicación de las metodologías. Verificar los procesos a lo largo del proyecto.
Developers.	1. Estefania Nájera de la Rosa 2. Raquel de la Garza von Rossum 3. Ana Paola Loreda Moreno	Implementar: ● Backend. ● Frontend. ● SO. ● Cifrado. ● Nube. Desarrollar prototipo en Figma. Gestionar los cambios en GIT. Subir a la nube. Considerar los entornos móviles.
Tester.	1. Raquel de la Garza von Rossum 2. Ana Paola Loreda Moreno	Realizar pruebas unitarias: ● Integración. ● Aceptación.

		Reportar errores. Validar: • Requisitos. • Seguridad. Asegurar la calidad del producto final.
--	--	--

PLAN DEL PROYECTO.

Sprint.	Actividades	Horas totales.	Fecha Terminación
Sprint 0. Gestión de usuarios.	• Definición de permisos por rol de usuario. • Definición de restricciones por rol de usuario. • Definición de pantallas requeridas por usuario de acuerdo a las tareas por usuario. • Diseño de pantalla de autenticación de usuario, recuperación de contraseña • Creación de pantallas considerando el inicio y menú de opciones correspondientes por usuario.	50 horas.	19 de marzo del 2026
Sprint 1. Gestión y búsqueda de libros.	• Creación de flujo entre el registro de libro a despliegue de libros con filtro. • Creación de pantallas para el registro de un libro por incluyendo autor, tema, título, clave y editorial y la búsqueda por estos mismos atributos por filtro.	50 horas.	19 de marzo del 2026
Sprint 2. Préstamo y devolución de libros.	• Planeación y creación de pantallas para la gestión de préstamo de libros, al igual que la devolución de libros en préstamo. • Creación de reglas y limitantes para la aprobación o denegación de préstamos solicitantes, considerando las anotaciones de las reglas	50 horas.	7 de mayo del 2026
TOTAL:		150 horas.	

ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS Y PAGOS.

Nuestros cálculos aproximados del proyecto se presentan resumidos en la siguiente tabla:

ESTIMADOS.	
FECHA DE TERMINACIÓN.	03 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ACEPTACIÓN.
HORAS PARA EL DESARROLLO.	150 HORAS.
INVERSIÓN REQUERIDA.	\$51,500.16 MXN

Cada integrante del equipo dedicará una hora diaria de trabajo, lo que en conjunto representa 15 horas semanales entre las tres integrantes. Considerando una duración total del proyecto de 10 semanas, se estima un total de 150 horas de trabajo. Con un costo de 20 dólares americanos por hora, el monto total correspondiente al desarrollo del proyecto asciende a \$3,000 USD.

Los estimados para esta propuesta no deben de ser modificados; sea por alguna modificación, como un descuento o adición al costo del proyecto, deberá ser especificado como un anexo a esta propuesta. Debe de ser realizada con la autorización del Representante Comercial del CDS. Aparte, cualquier requerimiento que sea considerado como funcional, se deberá de negociar a un costo de \$25.00 dólares americanos por la hora de desarrollo y será pagado en pesos mexicanos al tipo vigente en el momento.

Los precios estimados para el proyecto están descritos en pesos mexicanos, los cuales no están contemplando el 16% del IVA.. Esos mismos ya están contemplados un 15% de descuento.

FORMA DE PAGO.

El pago total del proyecto se aplaza de la siguiente manera:

- Pago 1: 30% del total del proyecto al aceptar esta propuesta. Es condición suficiente para realizar el pago contar con esta propuesta firmada por el líder o responsable del proyecto por parte de la Biblioteca de la Universidad de Ducky.
- Pago 2: 10% del total del proyecto al entregar los requerimientos: Gestión de usuarios. Es requisito suficiente para el pago, que el equipo de desarrollo entregue en formato electrónico el código fuente funcional, así como la documentación de las pruebas realizadas, y que el responsable del proyecto por parte de la Biblioteca de la Universidad Ducky proporcione un acuse de recibo vía correo electrónico.
- Pago 3: 15% del total del proyecto al entregar los requerimientos: Gestión de libros y Búsqueda de libros.
Es requisito suficiente para el pago, que el equipo de desarrollo entregue en formato electrónico el código fuente funcional y la documentación de pruebas y que el responsable del proyecto por parte de la Biblioteca de la Universidad Ducky proporcione un acuse de recibo vía correo electrónico.
- Pago 4: 15% del total del proyecto al entregar los requerimientos : Gestión de préstamo de libros y Devolución de libros. Es requisito suficiente para el pago, Es requisito suficiente para el pago, que el equipo de desarrollo entregue en formato electrónico el código fuente funcional y la documentación de pruebas y que el responsable del proyecto por parte de la Biblioteca de la Universidad Ducky proporcione un acuse de recibo vía correo electrónico.
- Pago 5: 30% del total del proyecto al concluir las pruebas de aceptación de usuario y la entrega de todos los entregables enunciados en esta propuesta. Será requisito suficiente para efectuar el pago una carta de aprobación de cierre de proyecto firmada por el/la (Cargo o responsable correspondiente) de la Universidad de Ducky.

EXPERIENCIA Y DIFERENCIADORES.

Nuestro equipo de desarrollo se distingue por sus capacidades de completar un proyecto de manera profesional dado a su experiencia técnica, formación integral educativa e interés por mejorar en su carrera. La combinación de las habilidades técnicas y sus aptitudes individuales crean un equipo de trabajo que se complementa para realizar un mismo objetivo de realizar una entrega de calidad, a prueba de error y centradas en los requerimientos del usuario. En este espacio presentamos la experiencia de cada una de las integrantes y proyectos en los que han desarrollado su conocimiento y habilidades.

- **Estefanía Nájera de la Rosa** ha desempeñado roles de Presidencia y Vicepresidencia en grupos STEM, desarrollando habilidades de liderazgo, resolución de conflictos y trabajo en equipo, esenciales para la coordinación de proyectos de software. De igual forma, cuenta con experiencia en proyectos de Backend con bases de datos, además de la visualización de los mismos con proyectos de Frontend.
- **Raquel de la Garza von Rossum** obtuvo experiencia enriquecedora en su intercambio internacional escolar en la universidad de Pôle Universitaire Léonard de Vinci en París, Francia, validando materias como Proyecto Base Tecnológica para la realización de proyectos de alta calidad cumpliendo los requerimientos de usuarios y Sistemas Operativos, curso fundamental para la carrera de tecnologías computacionales.
- **Ana Paola Loredó Moreno** ha trabajado de tiempo completo en Frontend y Backend, destacando en el diseño y desarrollo de interfaces usando Figma, asegurando experiencias de usuario intuitivas y accesibles. Al igual, desempeñándose en parte estructural de las aplicaciones, diseñando base de datos e implementando la lógica detrás de aplicación de uso operativo empresarial.

La carrera de tecnologías computacionales nos ha facilitado participar en proyectos de desarrollo de aplicaciones web, colaborando tanto en el área de Frontend como en Backend. En Frontend, hemos fortalecido nuestras habilidades mediante cursos enfocados en principios de UI/UX, lo que nos permite diseñar aplicaciones intuitivas, accesibles y centradas en la experiencia del usuario, haciendo uso de plataformas como Figma u otras para el diseño y flujo intuitivo de pantallas.

Por otro lado, hemos aplicado el pensamiento lógico y abstracto necesario para implementar soluciones funcionales utilizando distintos lenguajes de programación orientados al desarrollo web. Asimismo, contamos con experiencia en el diseño de bases de datos mediante modelos entidad-relación y el uso de herramientas y tecnologías como SQL, MariaDB, React y PHP.

TÉRMINOS Y CONDICIONES.

1. ACERCA DEL CONTRATO.

El presente documento establece los términos y condiciones bajo los cuáles, Estefania Nájera de la Rosa, Raquel de la Garza von Rossum y Ana Paola Loredó Moreno, estudiantes de la Universidad de Monterrey de la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales, se comprometen a desarrollar y entregar el sistema según los requerimientos del cliente Universidad Ducky, brindados por el contacto de por medio, siendo el Dr. Felipe de Jesús Rodríguez García.

2. ALCANCE DEL DESARROLLO.

Según los requerimientos establecidos, estos serán diseñados bajo la modularidad para adaptarse al modelo iterativo y seguir las metodologías de SCRUM y Software Seguro con la guía del SCRUM Master para cumplir con cada uno de los puntos a considerar por requerimiento en cada Sprint como el entregable por partes hasta completar el producto final.

Si a lo largo del desarrollo se presentan cambios en los requerimientos inicialmente establecidos que definen el proyecto, se harán cargos en el precio por \$10 USD extras a la cantidad inicial por horas de esfuerzo del equipo.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL.

Todo lo diseñado y desarrollado por parte del equipo, sean diagramas, documentación, base de datos y/o código, será propiedad de la Universidad Ducky una vez que se haya concluido y presentado el producto final y es elegido por el cliente para su implementación.

4. CONFIDENCIALIDAD.

Ambas partes se comprometen a mantener estricta confidencialidad con la información que será manejada a lo largo del desarrollo.

5. PLAZOS DE ENTREGA.

La duración estimada del proyecto es de 11 semanas, iniciando el día 23 de febrero del 2026, aunque dichas fechas podrán modificarse por causas de fuerza mayor o temas atribuibles al cliente Universidad Ducky.

6. SOPORTE.

El soporte de dicho sistema tendrá que ser contratado aparte de este desarrollo del producto.

7. LIMITACIONES.

El equipo no se hace responsable de la pérdida/mal uso del diagrama, documentación, base de datos y/o código creados para el proyecto.

8. TERMINACIÓN DE CONTRATO.

El presente contrato puede darse por terminado bajo alguna de estas situaciones:

- Mutuos desacuerdos.
- Incumplimiento de pagos.
- Fin del desarrollo de proyecto.


9. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN.

Este contrato se regirá de acuerdo a las leyes del municipio San Pedro Garza García, ubicado dentro del área metropolitana de Monterrey en el estado de Nuevo León, parte de los Estados Unidos Mexicanos.

FIRMAS DE CONFORMIDAD.

Revisado y Aprobado por

Dr. Felipe Rodríguez García Product Owner

Revisado y Aprobado por

Estefania Nájera de la Rosa SCRUM Master
